

## 4-1. 状況写真（1工区）



被災直後

既設水路工の袖部が掘れている



下流状況

流末処理：南足柄市施工 集水桝

### 施工予定（令和8年度）


植生土のう、小型ネット土のう、布製型枠工、丸太筋工、伏工

## 4-2. 状況写真（2工区）



**被災直後**

土砂が流出した様子

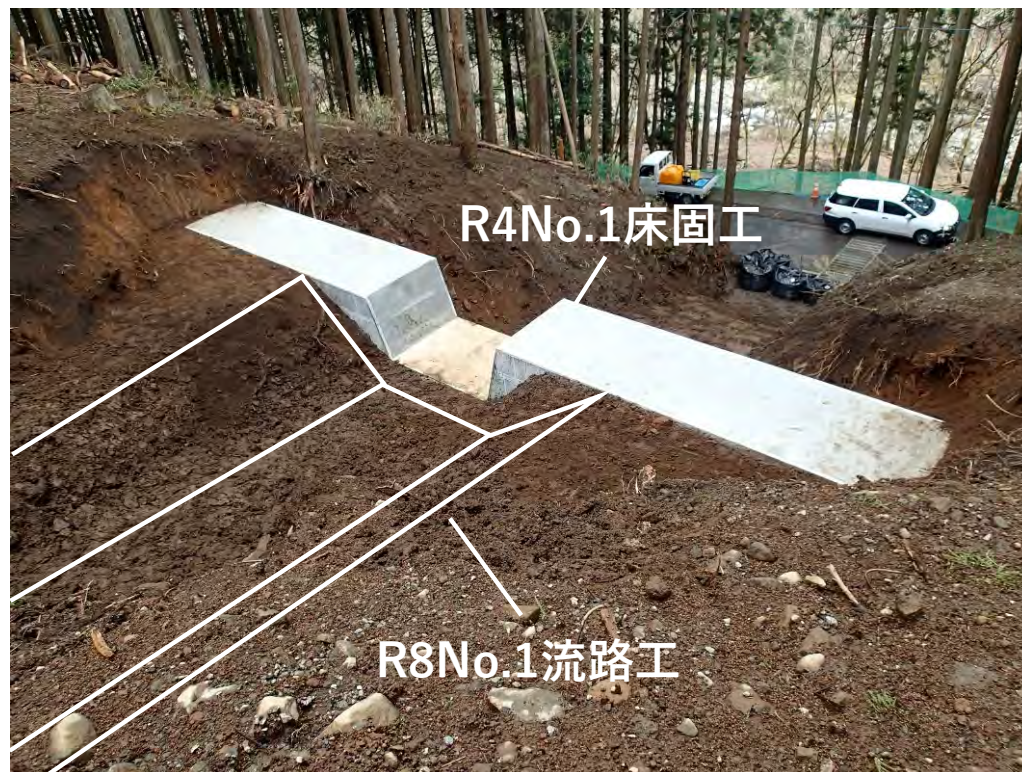

**現況**

令和2、4年に施工済

令和8年度に流路工の続きを施工予定

### 施工済

令和2年度 谷止工1基、床固工1基

令和4年度 床固工2基、流路工52m

### 施工予定（令和8年度）

流路工 22m

## 4-3. 状況写真（3工区）



被災直後

流末処理：南足柄市施工 集水柵



現況

谷止工 1基を現在施工中

施工予定（令和7年度）


谷止工

## 4-4. 状況写真（4工区）



被災直後

既設石積土留工あり

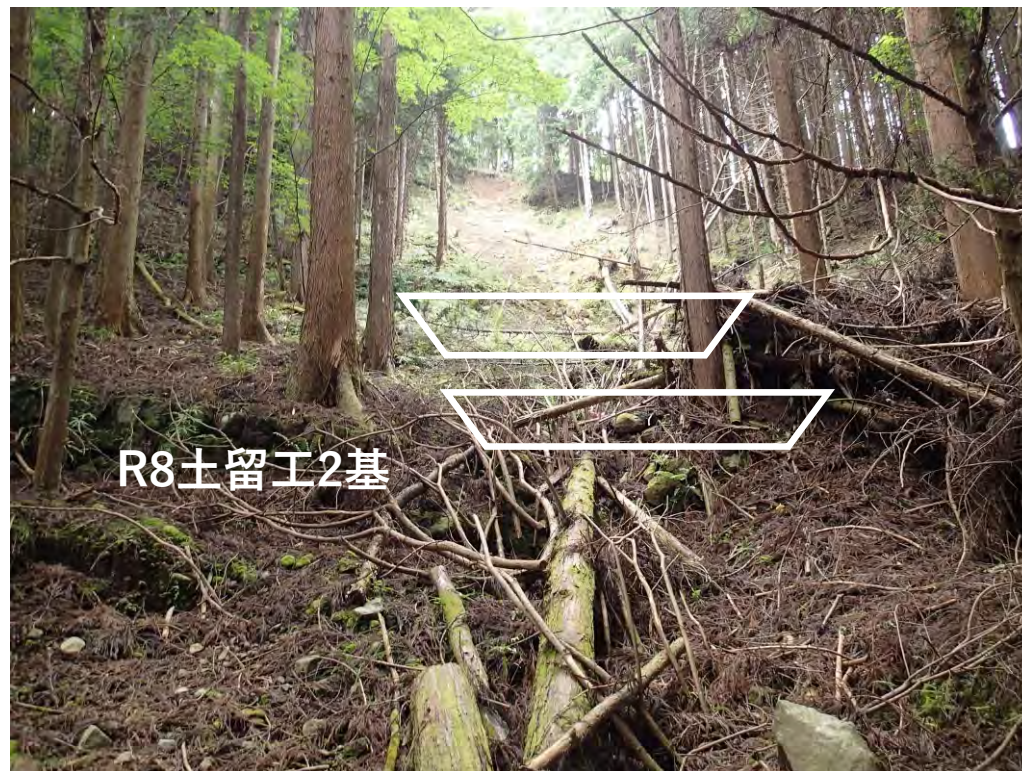

R8土留工2基

上流状況

土留工3個を施工予定

施工予定（令和8年度）

土留工2個、丸太柵工、伏工

## 4-5. 状況写真（5工区）



下流状況

斜面上に施工予定



上流状況

土留工 2 個施工予定

施工予定（令和9年度）

土留工 3 個、丸太柵工、伏工

## 9.保全対象



①保全対象 矢倉沢集落 人家16戸



②保全対象 人家



③保全対象 川入林道



④保全対象 水田



⑤保全対象 マス釣り場



⑥保全対象 矢倉沢上浄水場



⑦保全対象 矢倉沢貯水槽



⑧保全対象 取水口（4工区直下）
